

DOCUMENT PRODUIT PAR : ATD de Doué la Fontaine
Pascal GUILLOT

Route départementale n° 748 2x2

Travaux d'enrobés
 OA et bretelles de l'échangeur de Lanserre
 Commune de Juigné sur Loire


DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

DIFFUSION DU DOSSIER EXPLOITATION :

| service | complet | partiel | observations |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Dpt SSED | | | |
| ATD | | | |
| Direction | | | |
| Entreprise(s) | | | |
| Maître d'ouvrage | | | |
| Maître d'oeuvre | | | |
| Commune(s) | | | |
| Gendarmerie / Police | | | Murs-Erigné Les Garennnes sur Loire |
| SDISS | | | Brissac-Quincé |
| Autres gestionnaires routier (DDT, autoroute, DIRO, Dpt voisins.....) | | | Autoroutes du Sud de la France |
| Transports urbains et / ou transports scolaires | | | Irrigo, Aleop |

| Version document | Rédacteur | Date | Observations |
|------------------|-----------|------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

I Plan de situation :

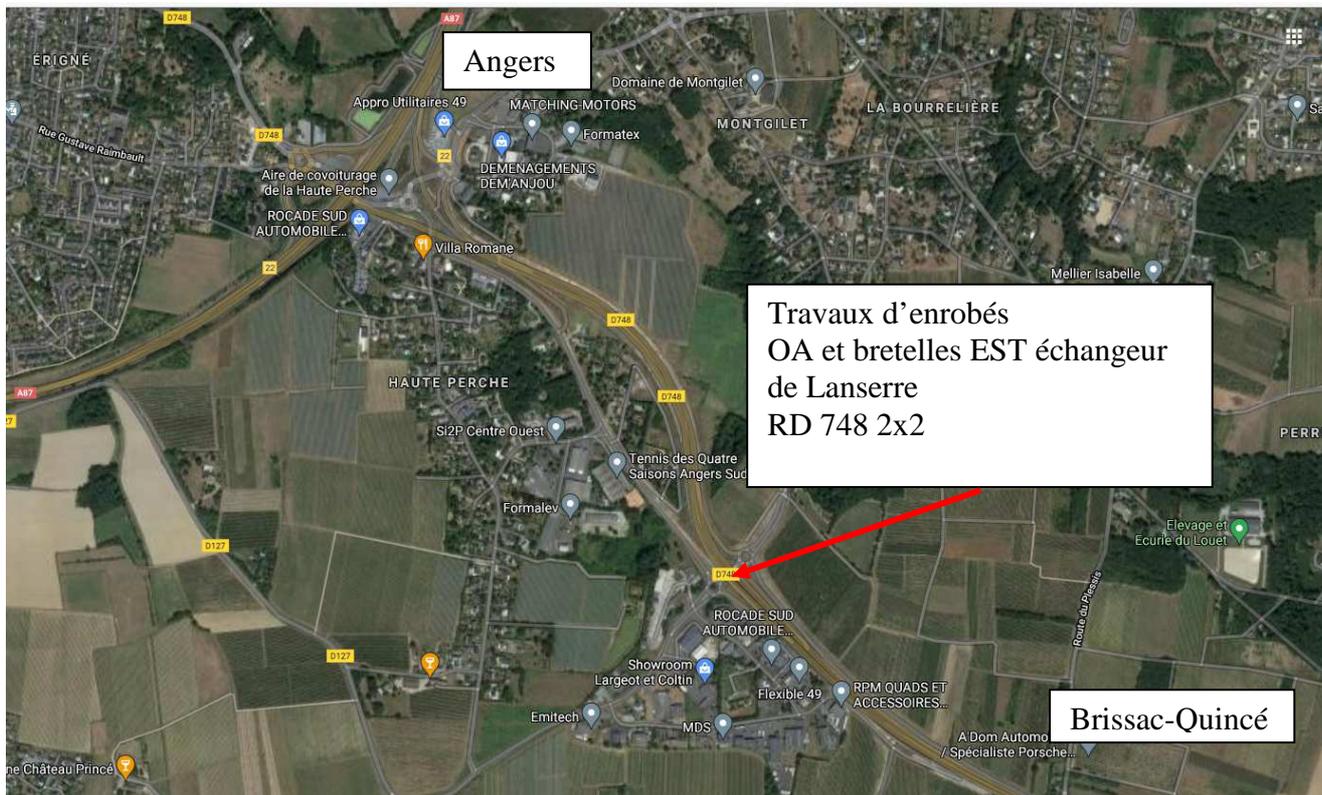

II Notice explicative :

A – DESCRIPTIF DES TRAVAUX :

L'opération consiste à réaliser la réfection de la couche de roulement sur l'ouvrage d'art dans le sens de circulation Brissac-Quincé vers Angers, puis les 2 bretelles côté EST de l'échangeur de Lanserre.

Elle s'inscrit dans le programme d'entretien annuel des chaussées 2021.

Les travaux programmés du 07 au 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00, ces travaux se situent sur une section de 2x2 voies à proximité de l'échangeur de Haute Perche et de l'A87 Nord, sur la route départementale n° 748 2x2, axe Brissac-Quincé vers Angers sur la commune de Juigné sur Loire.

La maîtrise d'ouvrage est assurée par :

Conseil Départemental de Maine-et-Loire / Direction Générale Adjointe Territoires

La maîtrise d'œuvre est assurée par : Direction des Routes Départementales / Agence technique départementale de Doué la Fontaine

B – TRAFIC et CONTEXTE LOCAL :

Gestion du trafic :

Le trafic est de 25 814 véh/jour en MJA avec 8 % de poids lourds, sur la RD 748 2x2.

Les heures les plus chargées sur la période sont de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h00

Prise en compte d'éléments spécifiques :

- liés à l'environnement du chantier :

- Information auprès de la commune de Brissac Loire Aubance, Juigné sur Loire, CCLLA

- proximité zone d'activités de Lanserre RD 127

- transports scolaires : Aléop et Irrigo

- Riverains ex RD 748 rue de Poitiers

- liés à la RD impactée par l'opération et RD environnantes

- réseau à 2X2 voies avec présence d'échangeur dans l'emprise et la desserte de la ZA de Lanserre RD 127

- le chantier impacte la continuité vers l'échangeur de Haute Perche.

- Enjeux liés aux transports exceptionnelles, = DDT contactée en amont

C - PLANNING PREVISIONNEL :

Les travaux sont prévus de jour du 07 au 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00

III Exploitation :

Il est proposé de réaliser ce chantier sur l'Ouvrage d'Art en journée en déviant le sens de circulation Brissac-Quincé vers Angers par la bretelle de sortie côté EST vers Lanserre, le giratoire de la RD 127, puis reprendre la bretelle d'insertion vers Angers,


Les travaux sur les bretelles côté EST sont prévues en chantier fermé, une déviation sera mise en place via l'échangeur de Haute Perche. Ces travaux sont prévus en dehors des horaires de pointe.

- A – MESURES D'EXPLOITATION :

Les travaux sont prévus à partir du **mercredi 07 au jeudi 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00**

Les mesures d'exploitation évolueront en fonction des phasages de chantier :

Plan global de l'opération

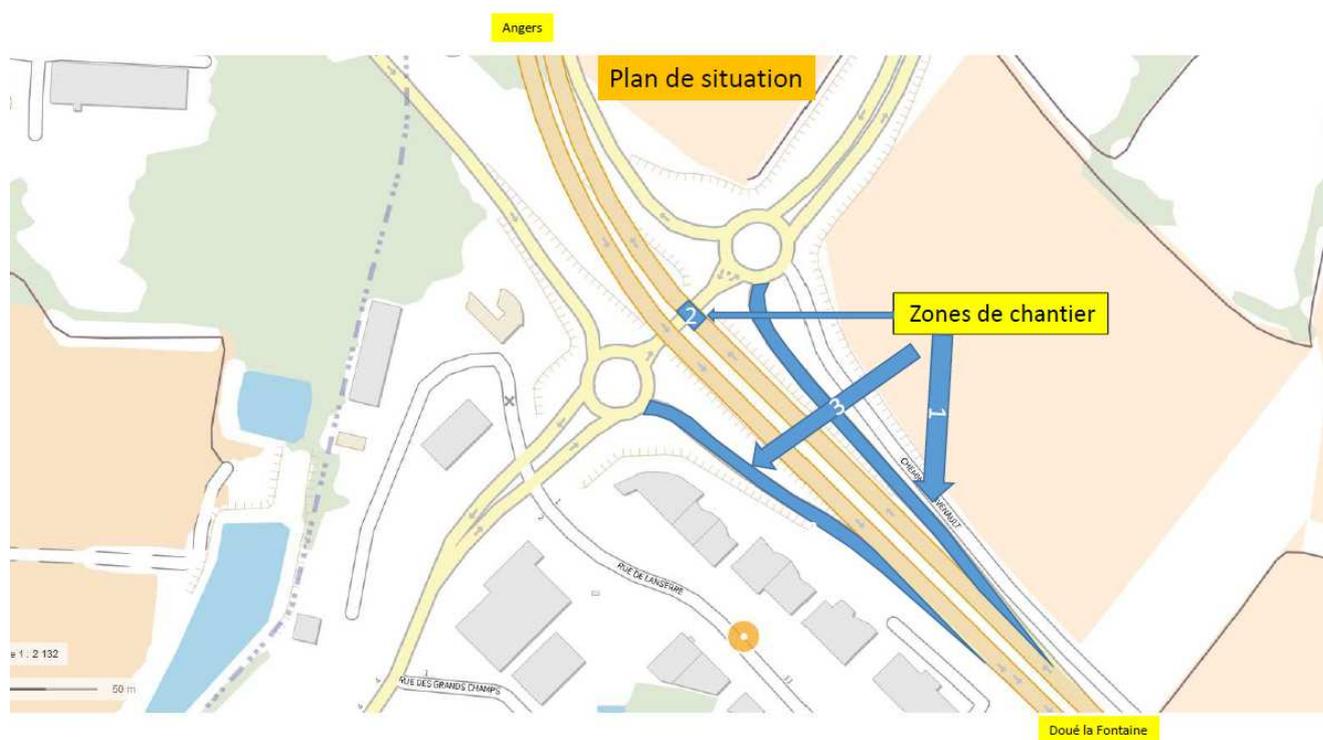



Phase N°1 : Bretonne de sortie Doué la Fontaine vers la zone d'activités Lanserre 07 juillet 2021

Travaux d'engravures et mise en œuvre de BBSG sur la bretelle de sortie vers le giratoire sens Doué vers Lanserre,

Une neutralisation de la voie de droite sens Doué vers Angers RD 748 est nécessaire pour assurer la sécurité des agents sur chantier,

La bretelle de sortie vers Lanserre sera fermée, les usagers seront déviés vers l'échangeur de Haute Perche via la bretelle de sortie vers Juigné sur Loire.

L'approvisionnement en BBSG s'effectuera par le giratoire Lanserre côté EST

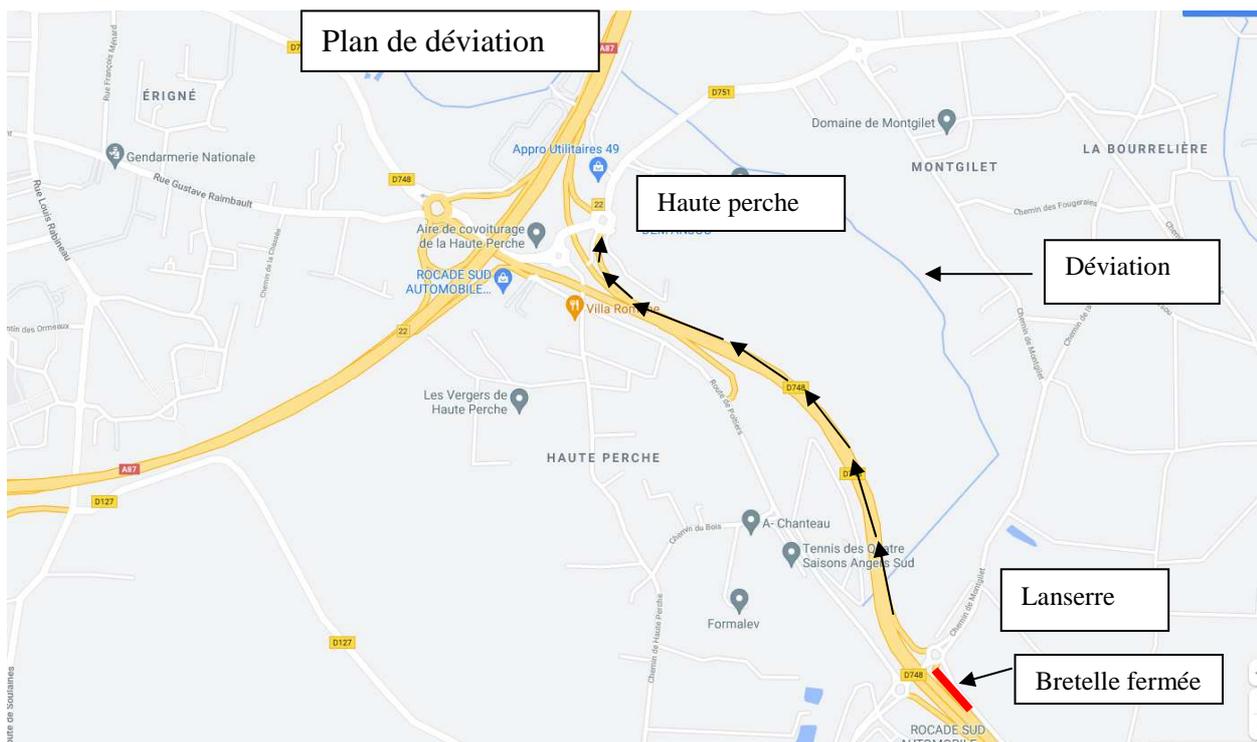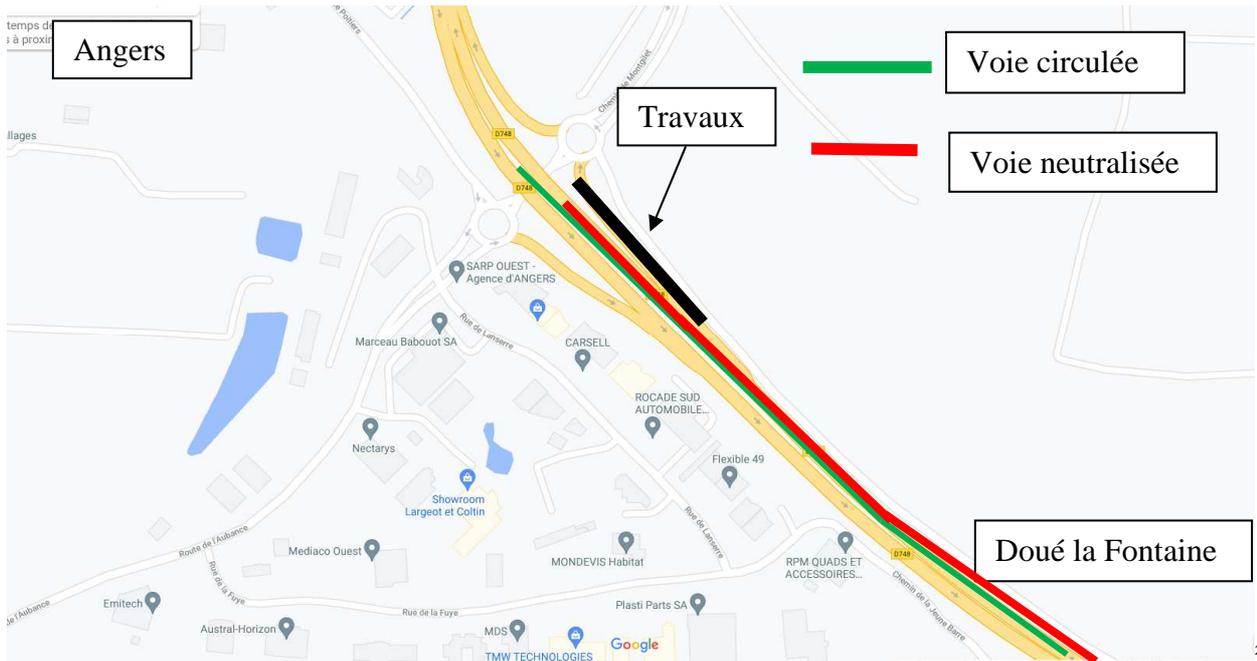

Phase N°2 : OA Lanserre déviation par les bretelles 08 juillet 2021 matin


Les Travaux de rabotage et mise en œuvre de BBSG sur l'ouvrage d'Art sur RD 748 dans le sens de circulation Doué la Fontaine vers Angers seront réalisés sous déviation vers la bretelle de sortie vers le giratoire de Lanserre côté EST, puis la circulation sera rétablie via la bretelle d'entrée vers Angers,

Neutralisation de la voie de gauche du PR 5+000 au 1+550, puis neutralisation de la voie de droite, pour une sortie obligatoire vers la bretelle de sortie vers le giratoire de Lanserre,

La RD 127 sera fermée au niveau de l'OA sens Sud / Nord, la circulation sera déviée par l'ex RD 748 rte de Poitiers, via l'échangeur de Haute Perche. Cette fermeture facilitera la fluidité du trafic de la RD 748 par les bretelles

L'approvisionnement en BBSG s'effectuera au niveau de la neutralisation de la voie de droite RD 748 2x2.

La signalisation horizontale sera effacée au niveau de l'OA dans le sens Brissac vers Angers, des panneaux d'information seront installés en amont pour signaler l'absence de marquage routier.

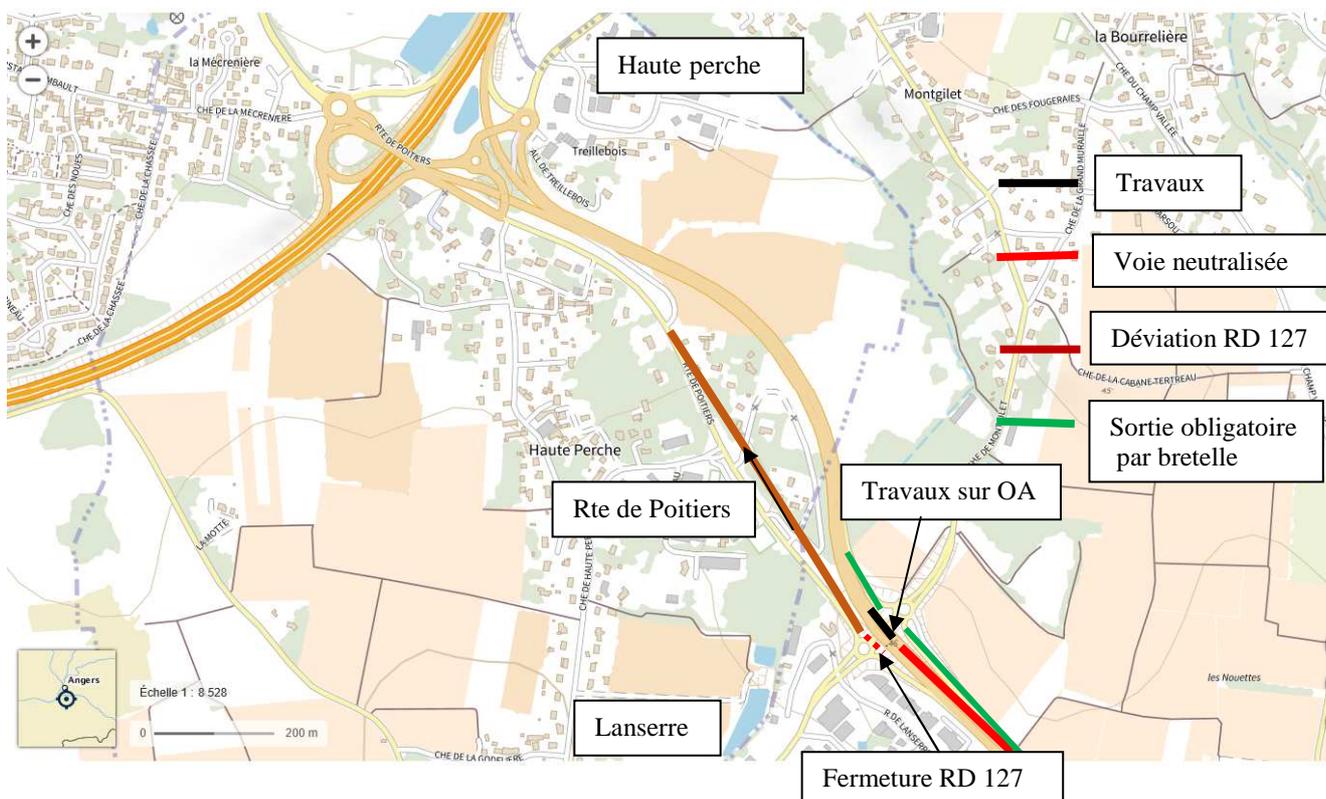

Phase N°3 : Bretelle d'entrée Lanserre vers Doué la Fontaine 08 juillet après-midi


Les travaux d'engravures et mise en œuvre de BBSG sur la bretelle d'entrée vers RD 748 (vers Doué la Fontaine),

La circulation sera déviée vers l'échangeur de Haute Perche, puis la bretelle de sortie Juigné sur Loire.

Une neutralisation de la voie de droite RD 748 2x2 sens Angers vers Doué la fontaine sera mis en place depuis le PR 1+575 au PR 2+700 pour assurer la sécurité des agents sur le chantier.

Les consignes d'accès et sortie du chantier s'effectueront par la RD 748 2x2 par la voie neutralisée.

Ces mesures peuvent être reportées d'une journée **météo**.

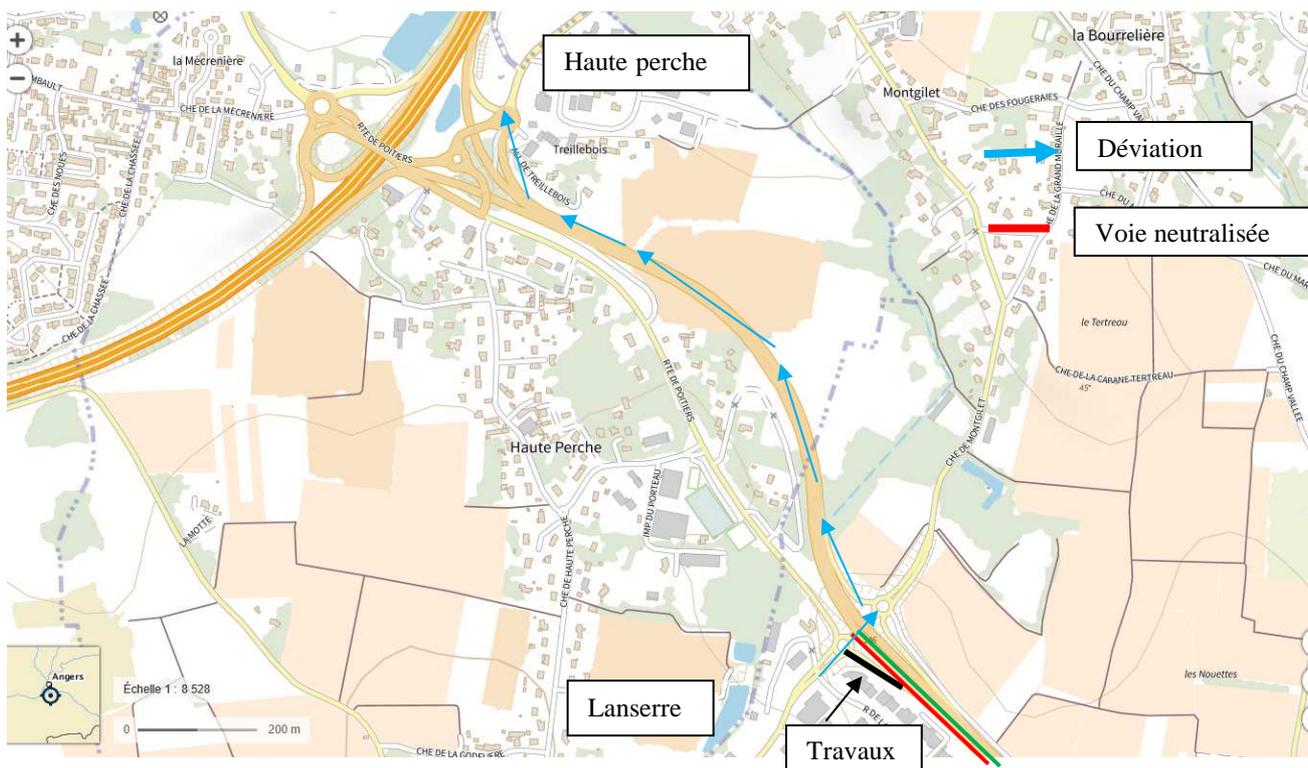

- B – INTERVENANTS :

- Responsable de la signalisation de chantier (pose, surveillance, dépose) :

Agence Technique Départementale de Doué la Fontaine, Ce de St Melaine sur Aubance
Entreprise Eiffage St Mathurin sur Loire

- Responsable de la signalisation de déviation (pose, surveillance, dépose) :

CE de St Melaine sur Aubance

- n° 24 / 24 : **Entreprise Eiffage**

- Autres intervenants : Signalisation horizontale : **Entreprise Signature**

- C – VOLET ORGANISATIONNEL (interne Dpt) :

- Des patrouilles de surveillance dans la journée sont prévues par le CE de St Melaine sur Aubance

- Information du RI : oui

- ASF pour information

Le chantier décrit ci-dessus n'implique pas une organisation spécifique du travail en interne.
Cette organisation repose sur les horaires habituels.

-D – INFORMATION :

- A l'usager :

☞ consultation service communication : NON

☞ panneau d'information sur site J- : **informant des restrictions de circulation au plus tard la semaine précédant les travaux,**

Travaux d'enrobés
Sur bretelle
Le 7 et 8 juillet 2021
Circulation perturbée

- Aux intervenants et partenaires : Eiffage, ASF, CCLA, BLA

☞ information préalable des mairies de Brissac Loire Aubance, Les Garennes sur Loire

☞ diffusion du dossier (voir page de garde)

- ANNEXES :

- Plan global de l'opération

- Plans des phases de signalisation

- Projet d'Arrêté de circulation

